ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Центр инновационных компетенций

Программа повышения квалификации

«Освоение морских месторождений углеводородов»

Нормативная база проектирования, планирование, организация и проведение работ на шельфе

Управление морским нефтегазовым проектом

Профессор кафедры автоматизированного проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности, д.т.н.

Ермаков А.И.

План практического занятия 2

- Нормативно-правовое обеспечение проекта на шельфе
- Согласование проекта на шельфе (Проект «Штокман»)
- Генеральный план согласования

Основные этапы и документы согласования для реализации проекта на шельфе РФ

- Получение лицензии на разработку месторождения
- Проектирование и утверждение схемы разработки месторождения
- Разработка проекта обустройства месторождения
- Прохождение экологической экспертизы проектной документации: положительное заключение
- Государственная экспертиза проектной документации: положительное заключение
- Получение разрешение на участки акватории и суши

Управление согласованием проекта «Штокман»

- Формирование структуры управления согласованием проекта;
- Разработки и ведения Генерального плана согласований проекта;
- Контроля за выполнением плана согласований;
- Координации получения согласований между компанией и подрядчиками;
- Ведения базы данных по согласованиям проекта;
- Формирования процедур по получению необходимых согласований и разрешений;
- Мониторинга состояния нормативно-правового поля реализации проекта;
- Разработки нормативов и стандартов согласования при реализации проекта.

Ключевые согласования для начала строительных работ (после получения положительного заключения ГГЭ):

- ***Разрешение на строительство*** объектов от Роснедр, морские объекты в границах лицензионной зоны (ПДК, трубопроводы, скважины). Срок рассмотрения заявочного пакета – 10 дней.
- ***Разрешение на строительство*** объектов от Правительства Мурм. обл., береговые объекты (СПГ, УПДК, береговой тр-д, вспомог. объекты Срок рассмотрения заявочного пакета – 10 дней.
- Разрешение на установку объектов от Росприроднадзора, (трубопровод и ВОЛС) вне лицензионной зоны. После Главгосэкспертизы. Срок рассмотрения заявочного пакета – 4 мес.

Согласование ПД и получение разрешение на строительство морских объектов внутри лицензионной зоны (ПДК; Плем; Бурение)

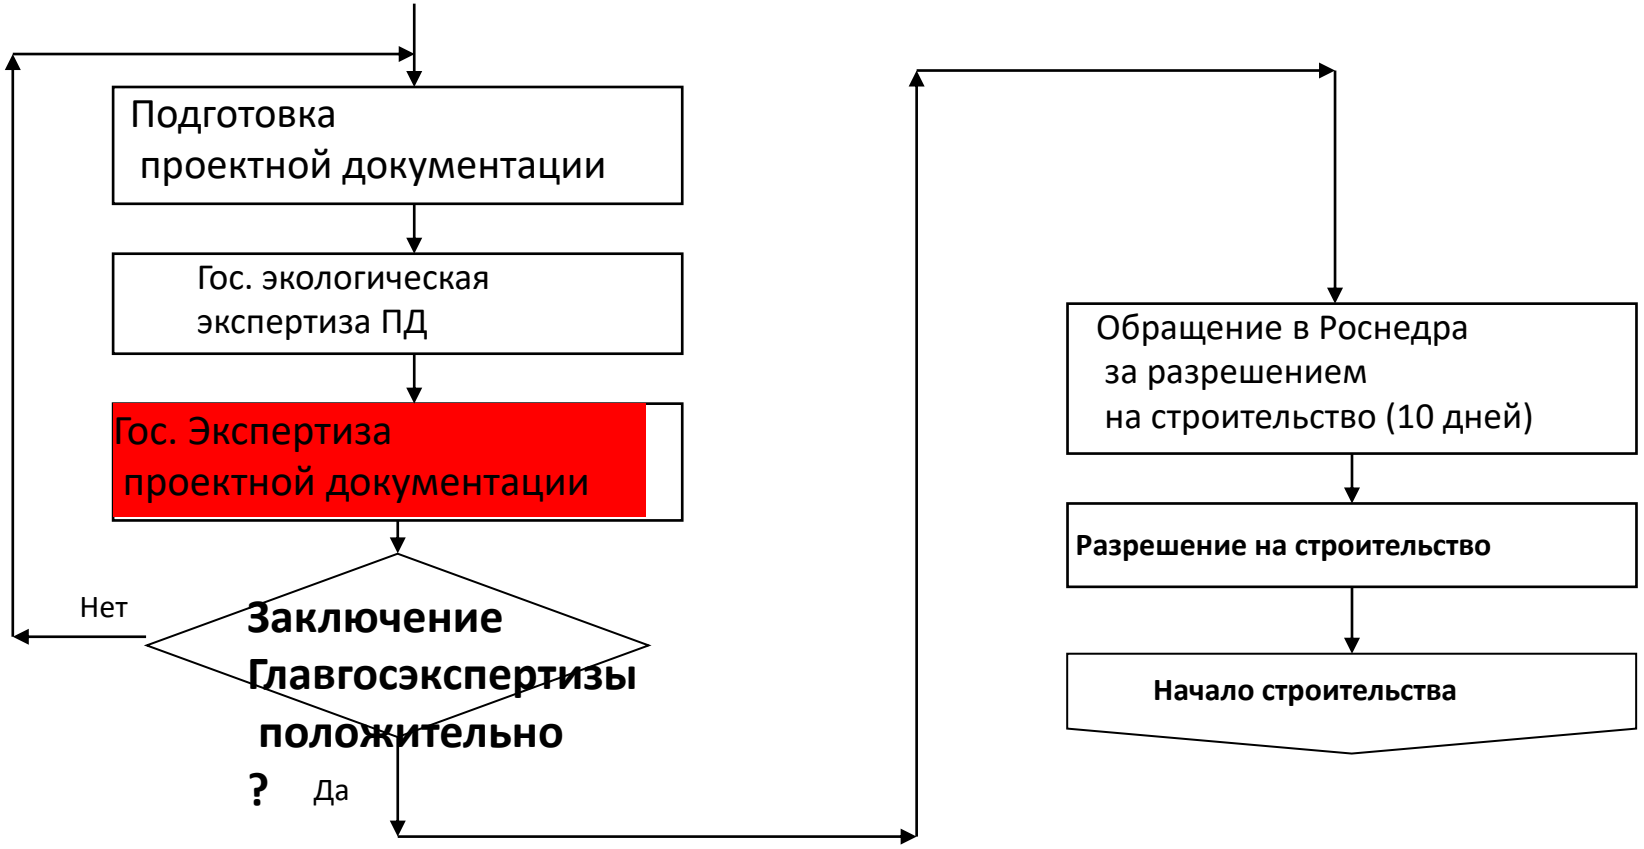

Согласование ПД и получение разрешение на строительство морских объектов вне лицензионной зоны (трубопровод; ВОЛС)

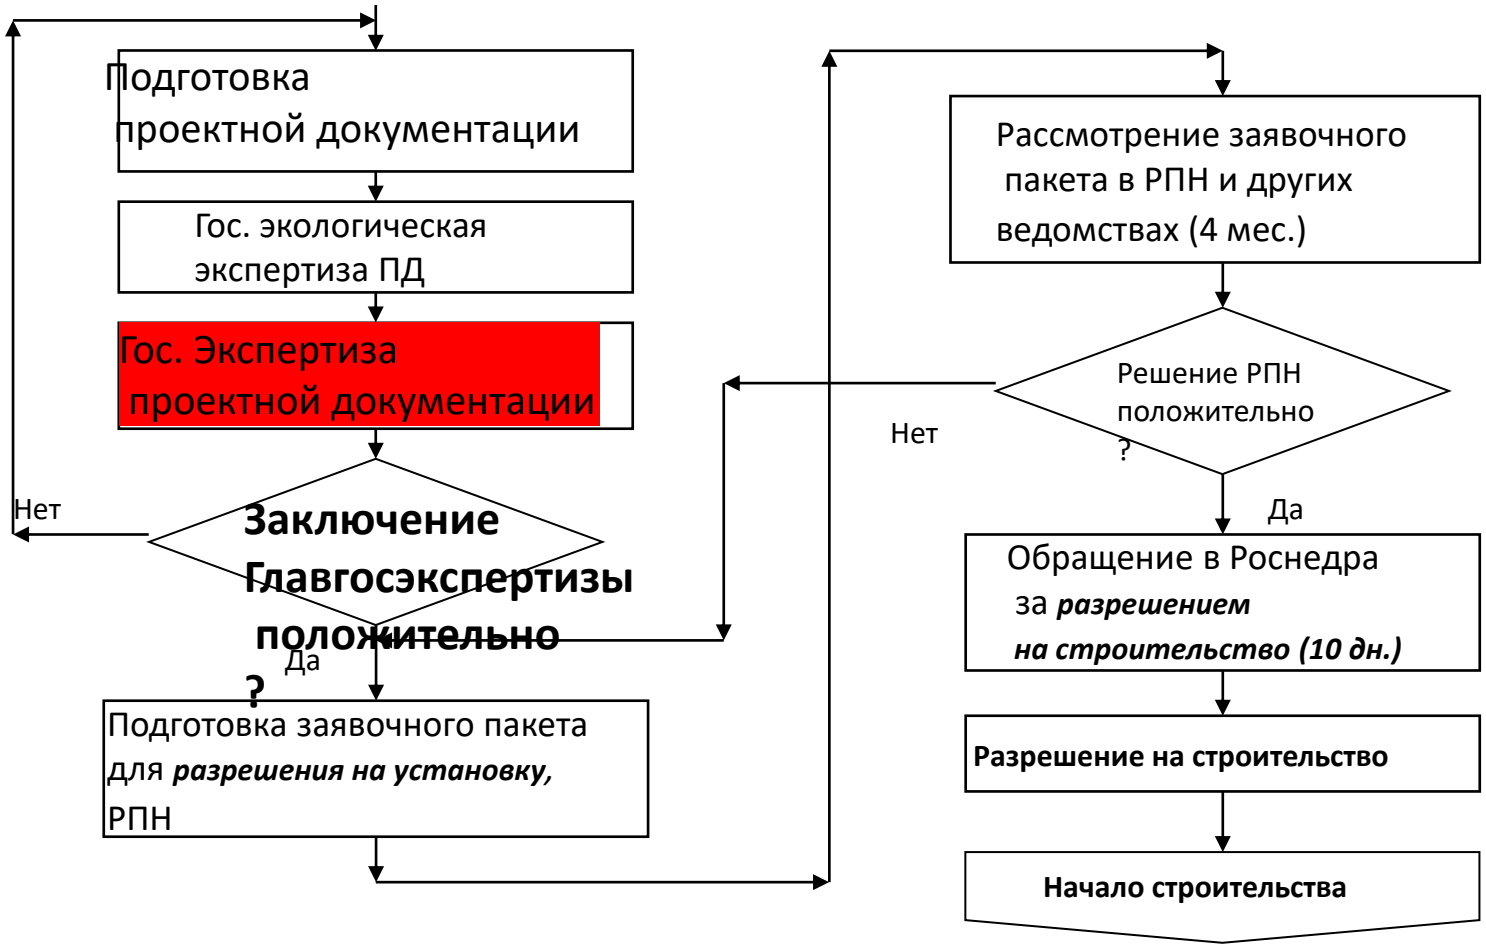

Согласование ПД и получение разрешение на строительство береговых объектов

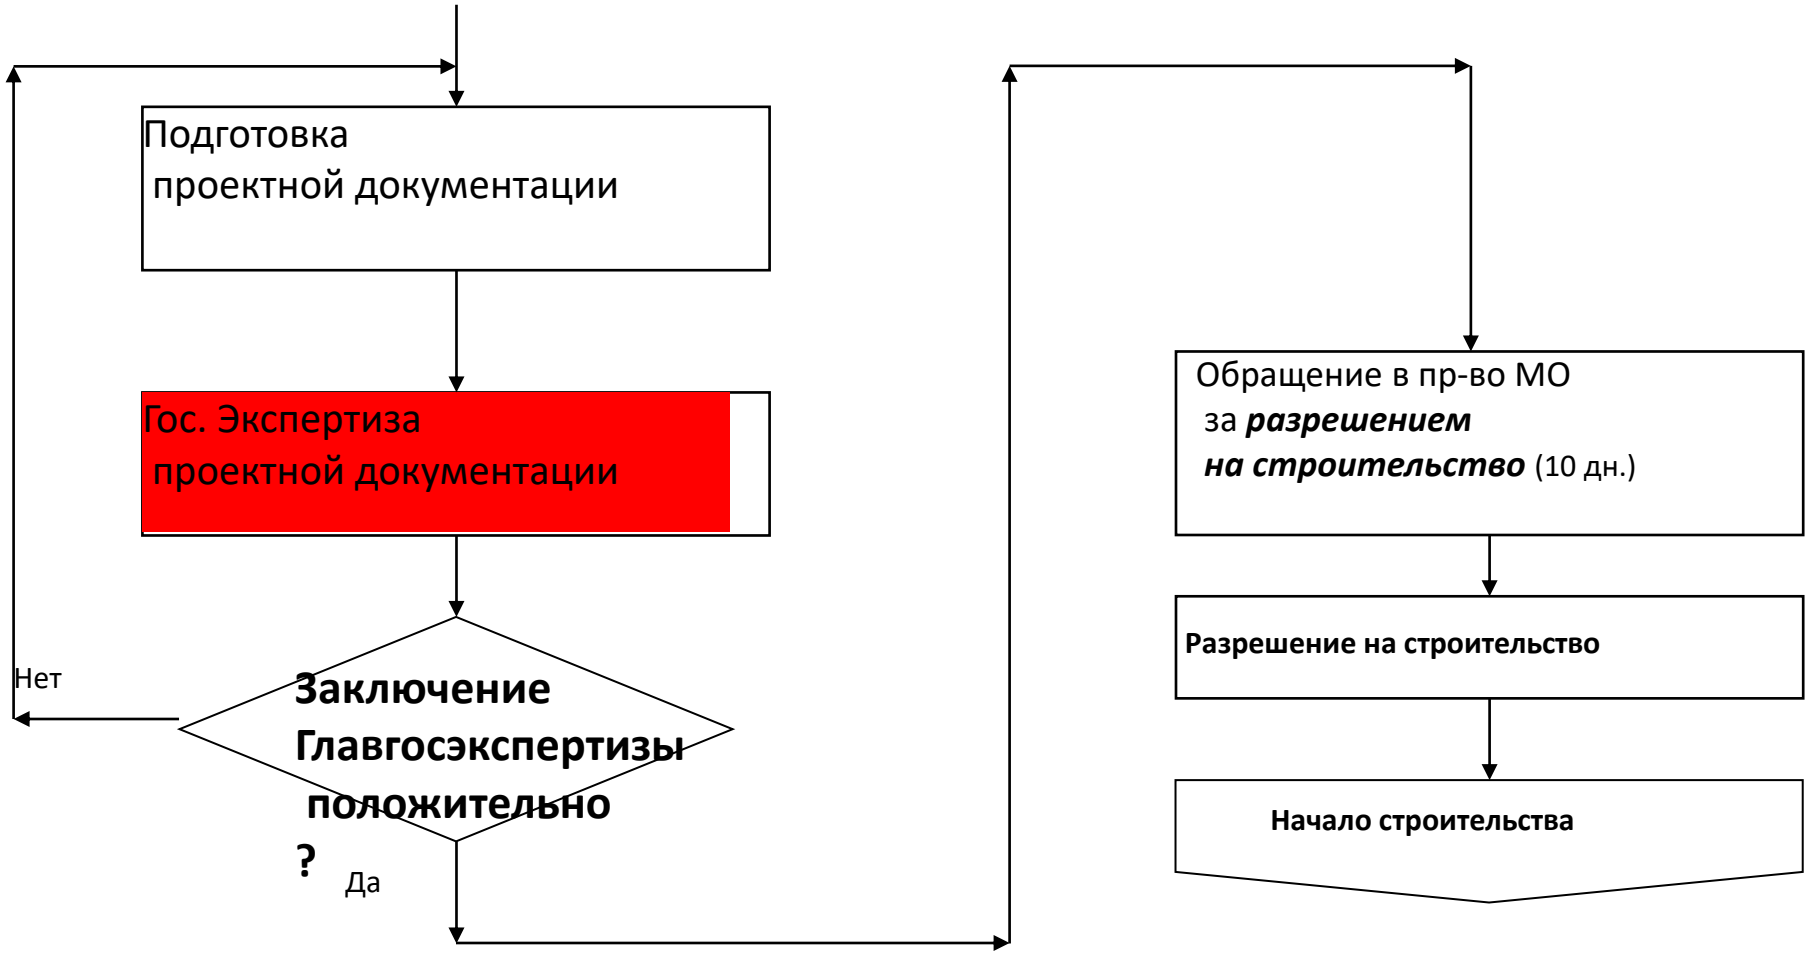

Генеральный План Согласований – инструмент управления согласованиями

- Планирование;
- Контроль;
- Координация согласований по проекту.

Генеральный план согласований координируется с общим планом реализации проекта.

Генеральный План Согласований – инструмент управления получением разрешений и согласований

Microsoft Excel - MAP_SD_1_Rev. 01

DRAFT Rev. 01

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ШТОКМАНОВСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ: ОЧЕРЕДЬ 1
MASTER APPROVAL PLAN (MAP) FOR SHTOKMAN GAS CONDENSATE INTEGRATED FIELD DEVELOPMENT: PHASE 1

№	Дата внесения изменения *Date change made*	Объект *Facility*	Наименование согласования (Rus)	*Approvals (Engl)*	Предварительные условия *Prerequisits*	Юридическая и нормативная основа *Legal and normative base*	Планируемые сроки получения согласования Planned *Dates of approval*	Ответственная группа *Responsible Group*	Ответственное лицо *Person responsible*	Статус *Status*	Организация согласования *Issuing Authority*	Регистр. № *Approval Ref. No.*	Дата согласования *Approval Date*	Дата окончания действия согласования *Expiration Date*	Ссылочный номер в базе данных SD *ADMS Document No.*	Комментарии *Comments*
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				I. Стадия проектирования (До этапа FID) ***Design Stage (Before FID)***												
				I.I. Стадия проектирования: Первый пусковой компекс ***Design Stage: Start-Up I***												
		Месторождение *Field*	Лицензия на разработку месторождения (Держатель лицензии - ООО "Газпром нефть шельф")	*Field development licence (Licence Owner - LLC "Gazprom Neft Shelf")*		Закон о недрах *Subsoil Law*		ООО "Газпром добыча шельф" (ГДШ) LLC "*Gasprom dobicha shelf*" (*GDSh*)	Губарев *Gubarev*	Выполнено *Done*	МПР *MNR* Роснедра *Rosnedra*			Март 2043г. *March 2043*		Необходимо внесение изменений в лицензию в связи с изменением сроков ввода месторождения, а также изменением законов о континентальном шельфе, о внутренних морях, об исключительной экономичекой зоне *Changes in the license shall be made due to new date of field development and new version of laws on continental shelf, internal seas, exceptional economic zone.*
		Месторождение *Field*	Заключение Центральной Комиссии по Разработке (ЦКР) на проект разработки месторождения	*Central Development Committee (CDC) conclusion on the Field Development Project*	Проект разработки месторождения *Field Development Project*	Закон о недрах *Subsoil Law*		ГДШ *GDSh*	Губарев *Gubarev*	Выполнено *Done*	ЦКР *CDC*	Протокол ЦКР *CDC Protocol* №73 Г/2007	21.03.07.			
		Месторождение *Field*	Протокол ГКЗ пересчета запасов углеводородов	*Updating reserves GCZ Protocol*		Закон о недрах *Subsoil Law*	25.09.09.	ГДШ *GDSh*	Губарев *Gubarev*	Выполнено *Done*	GKZ *ГКЗ*	Протокол ГКЗ 2019 ДСП от 22.10.09. *Protocol GKZ DSP*	22.10.09.			

Page 1

Спасибо за внимание!
